阪文建･見学会、勉強会

- 仁部家住宅（茅葺）

清和源氏の直系子孫（多田神社総代）であり、由緒ある。（江戸初期）

- 静思館（小屋裏他）

旧冨田家住宅（古美術商）昭和初期の建造物･猪名川町の買い取り公開

仁部家住宅　茅葺替え工事(1)

全景

正面工事中

仁部家住宅　茅葺替え工事（2）

葺き替え作業中

葺き替え作業・見学会

仁部家住宅　茅葺替え工事(3)

記念写真

静思館　小屋裏見学(1)

囲炉裏の煙で茅を燻蒸

洋風トラスに茅葺　床は防火の為漆喰の土間

静思館　小屋裏見学(2)

洋風トラスに茅葺　見学会メンバー

完

2021年4月
2日

参考資料（施工手順　1、2）

茅葺手順

旧葺材解体

野地作り

下地結い

野地作り

下地結い

軒付

隅部

軒付

平部

けらかえし

参考資料（施工手順　3、4）

平葺
隅棟つくり

平葺

平葺
針取り

平葺
針縄締め

棟造り

棟造り

参考資料（施工手順　5）

仕上
刈込み

仕上
突きならし

仕上
軒刈込み

参考資料(概要)

工事概要図　　丸葺き工法

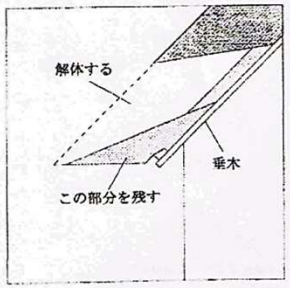

①軒部を残し、水切部から上の表面の茅を解体する。

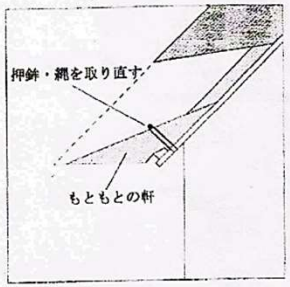

②軒を整え、緩んでいる押鉾は取り直し，締め付ける。

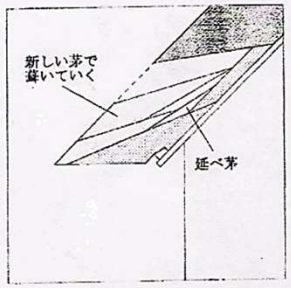

③延べ茅で調整しながら勾配に気を付け、葺いていく。

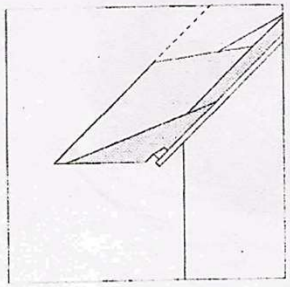

④解体と平葺を繰り返し、葺き上がっていく。

⑤仕上は叩き込み、刈り込みによって行う。

工事概要図　　全面葺替

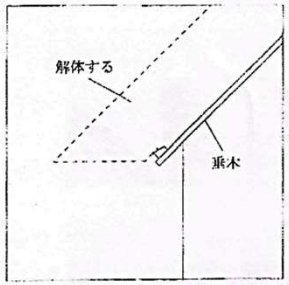

①茅をすべて解体し、緩んでいる縄は締めなおす。

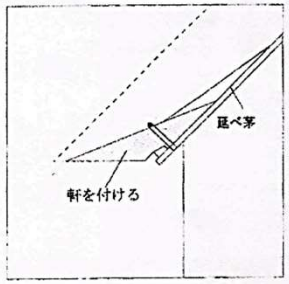

②軒付を行う。

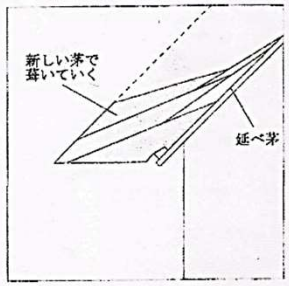

③延べ茅で調整しながら勾配に気を付け、葺いていく。

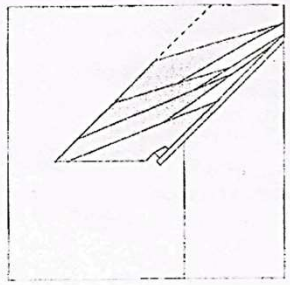

④葺き上がり棟を作る。

⑤仕上は叩き込み、刈り込みによって行う。
